




INFORME DEL ESTADO MENSUAL DE OBRA N° 10

ABRIL 2018


**56 VIVIENDAS PARCELA 22 PLAN SECTOR UE 107, "VALDELARCIPRESTE",
ARGANDA DEL REY, MADRID**



AVANCE DE LA OBRA

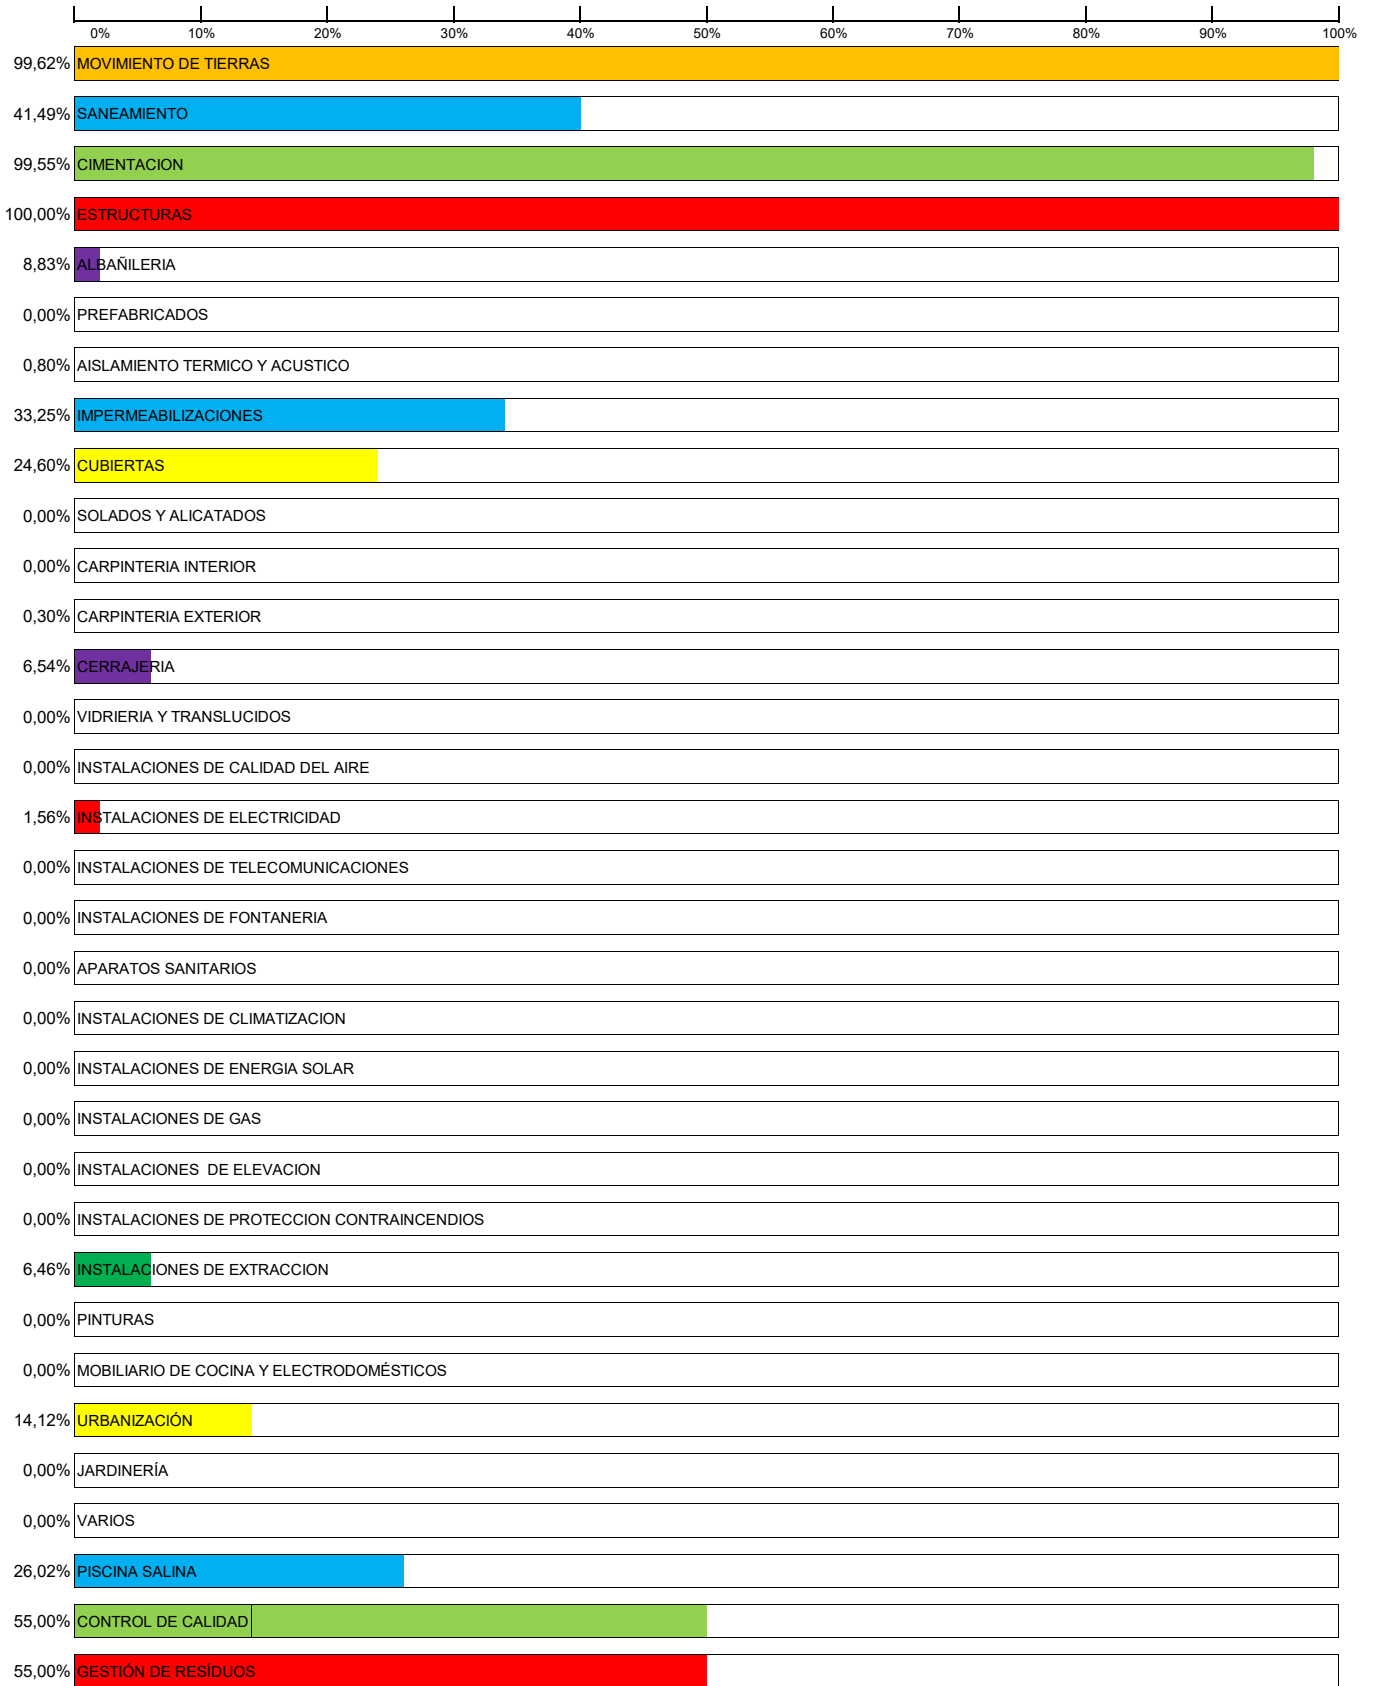

ESTADO DE LA OBRA



ESTADO ACTUAL DE LA OBRA**ANALISIS DE LA MARCHA DE LA OBRA****ABRIL 2018**

Continúa la ejecución de la fachada de ladrillo visto, con la colocación a su vez de los cargaderos y precercos de carpintería exterior. Actualmente los trabajos han alcanzado ya la planta tercera de la edificación.

Continúa también la ejecución de la formación de pendientes con mortero en las cubiertas no transitables, como paso previo a la impermeabilización de las mismas.

Ha dado comienzo la colocación de los conductos de extracción de garaje hasta planta cubierta a través de los patinillos habilitados a tal efecto.

4. FOTOGRAFÍAS

