




**INFORME DEL ESTADO MENSUAL DE OBRA N° 11**  
**MAYO 2018**

**56 VIVIENDAS PARCELA 22 PLAN SECTOR UE 107, "VALDELARCIPRESTE",  
ARGANDA DEL REY, MADRID**



AVANCE DE LA OBRA

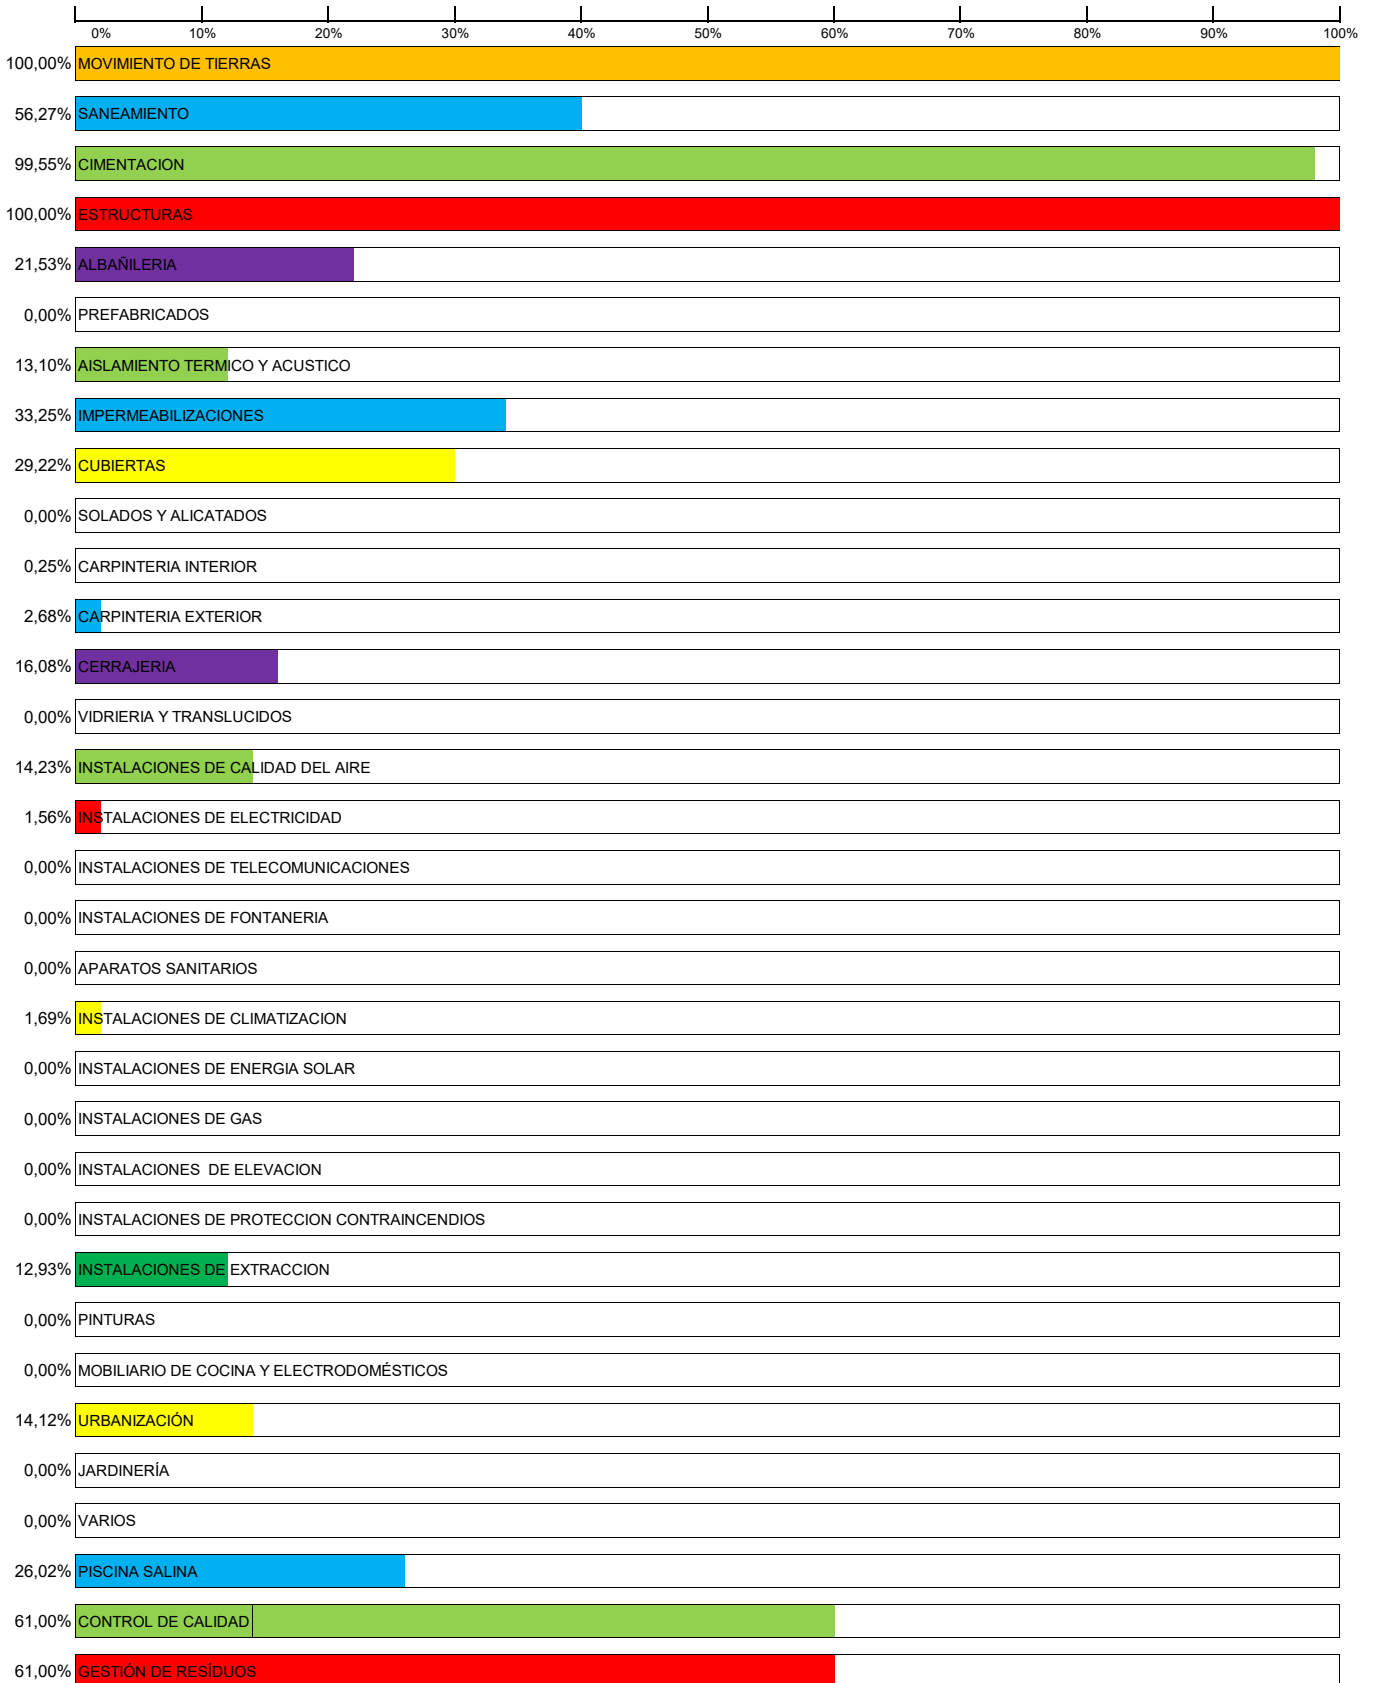

ESTADO DE LA OBRA



**ESTADO ACTUAL DE LA OBRA****ANÁLISIS DE LA MARCHA DE LA OBRA****MAYO 2018**

Continúa la ejecución de la fachada de ladrillo visto, con la colocación a su vez de los cargaderos y precercos de carpintería exterior. Actualmente los trabajos han alcanzado ya la cubierta de la edificación en uno de los portales, continuando en el resto. Paralelamente ha dado comienzo el tabicado interior de las viviendas y ejecución de las medianerías entre los distintos portales y las escaleras.

Tras finalizar la ejecución de la formación de pendientes de las cubiertas, ha dado comienzo la impermeabilización de las mismas previa a las pertinentes pruebas de estanqueidad.

Ha dado comienzo también la colocación de los conductos de calidad de aire de los baños y cocinas de las viviendas.

4. FOTOGRAFÍAS

