




INFORME DEL ESTADO MENSUAL DE OBRA N° 12

JUNIO 2018


**56 VIVIENDAS PARCELA 22 PLAN SECTOR UE 107, "VALDELARCIPRESTE",
ARGANDA DEL REY, MADRID**



AVANCE DE LA OBRA

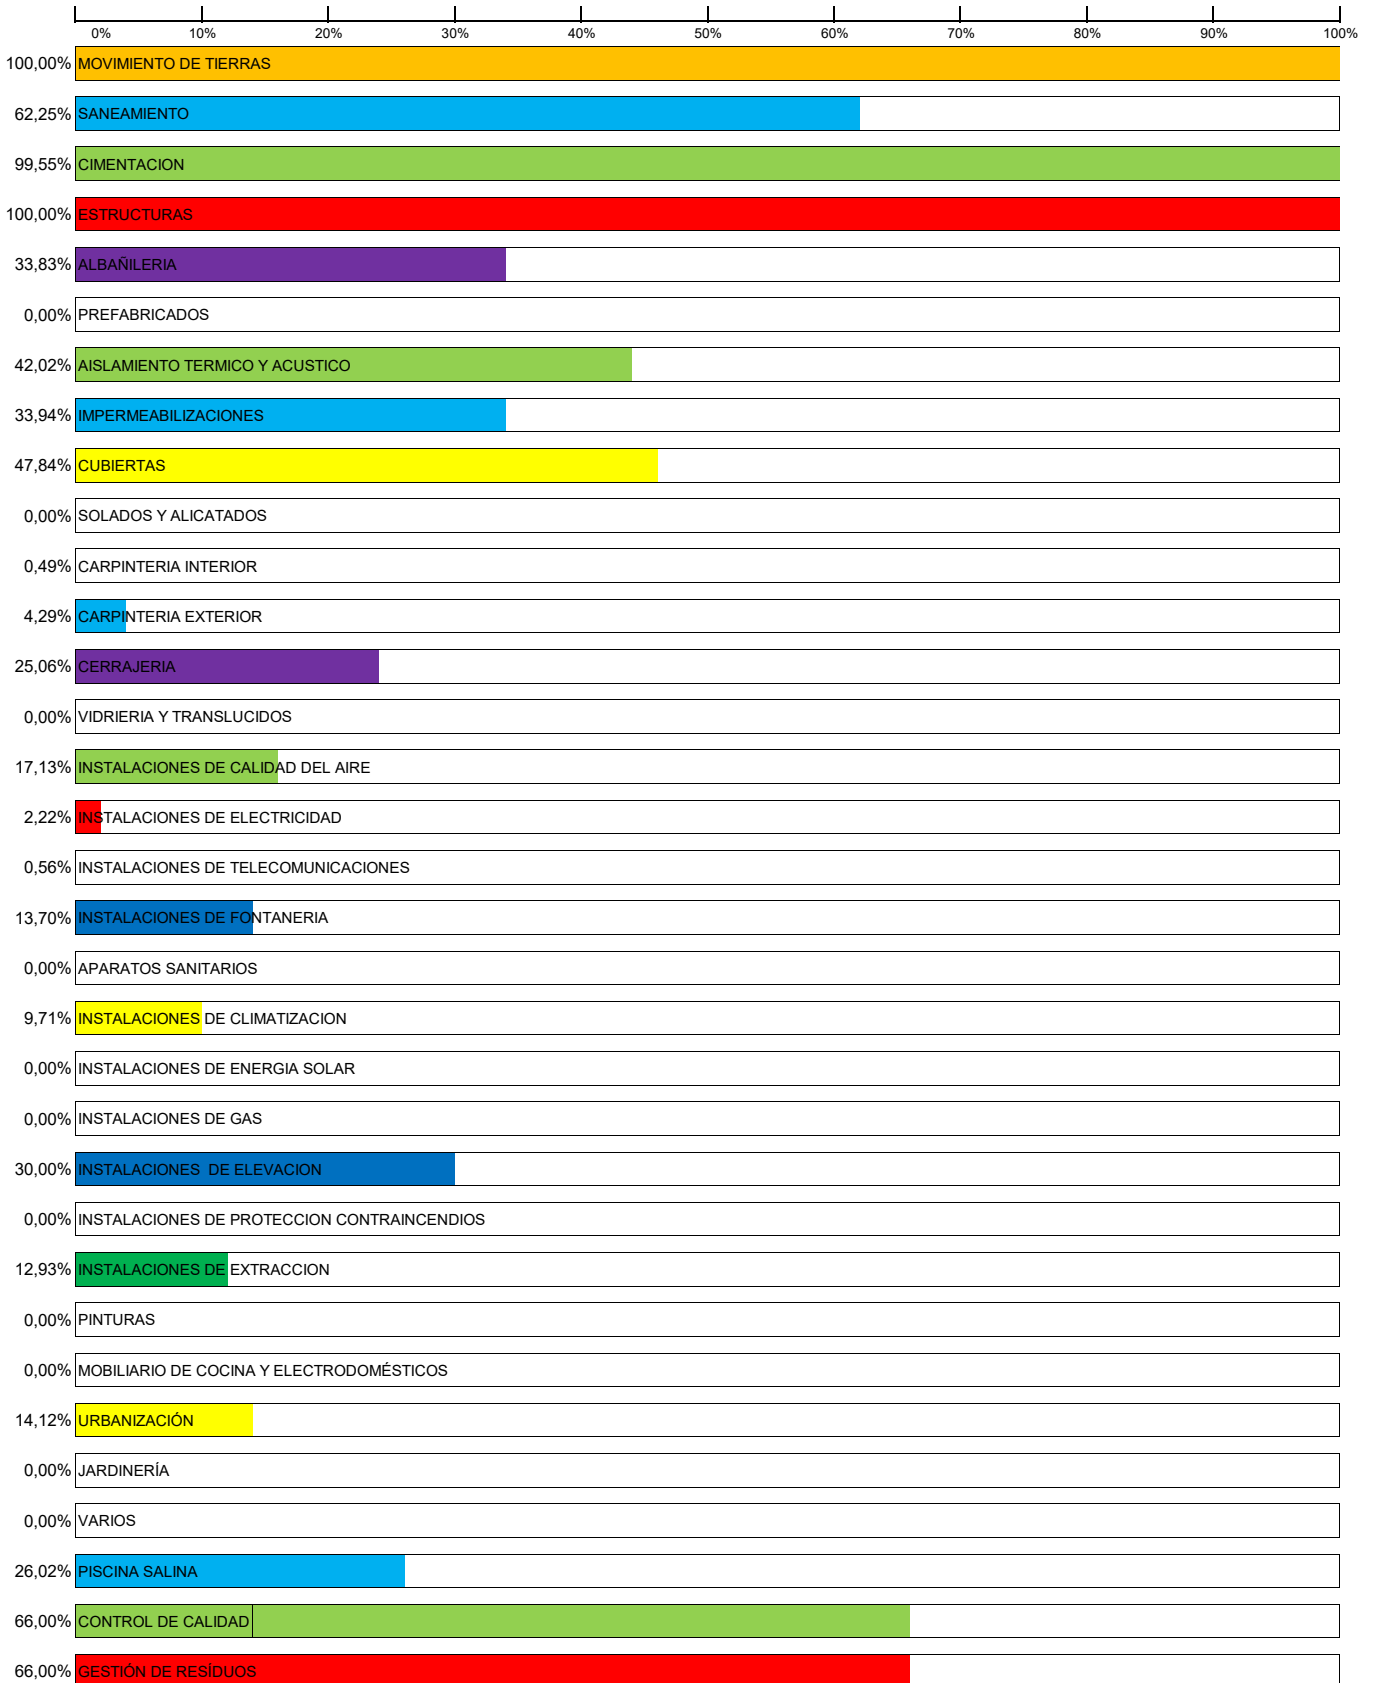

ESTADO DE LA OBRA



ESTADO ACTUAL DE LA OBRA

ANÁLISIS DE LA MARCHA DE LA OBRA

JUNIO 2018

Continúa la ejecución de la fachada de ladrillo visto, con la colocación a su vez de los cargaderos y precercos de carpintería exterior. Continúa igualmente el tabicado interior de las viviendas y la ejecución de las medianerías entre los distintos portales y las escaleras. Han dado comienzo los trabajos de aislamiento acústico en el suelo de las viviendas, así como la colocación del aislamiento previo a la instalación del suelo radiante.

Prosigue la ejecución de las cubiertas del edificio, con sus correspondientes pruebas de estanqueidad.

Continúa también la colocación de los conductos de calidad de aire de los baños y cocinas de las viviendas.

4. FOTOGRAFÍAS

