



INFORME DEL ESTADO MENSUAL DE OBRA N° 9

MARZO 2018

**56 VIVIENDAS PARCELA 22 PLAN SECTOR UE 107, "VALDELARCIPRESTE",
ARGANDA DEL REY, MADRID**






56 VIVIENDAS PARCELA 22 PLAN SECTOR UE 107, "VALDELARCIPRESTE", ARGANDA DEL REY, MADRID

Nº DE INFORME:


9

MARZO 2018

AVANCE DE LA OBRA

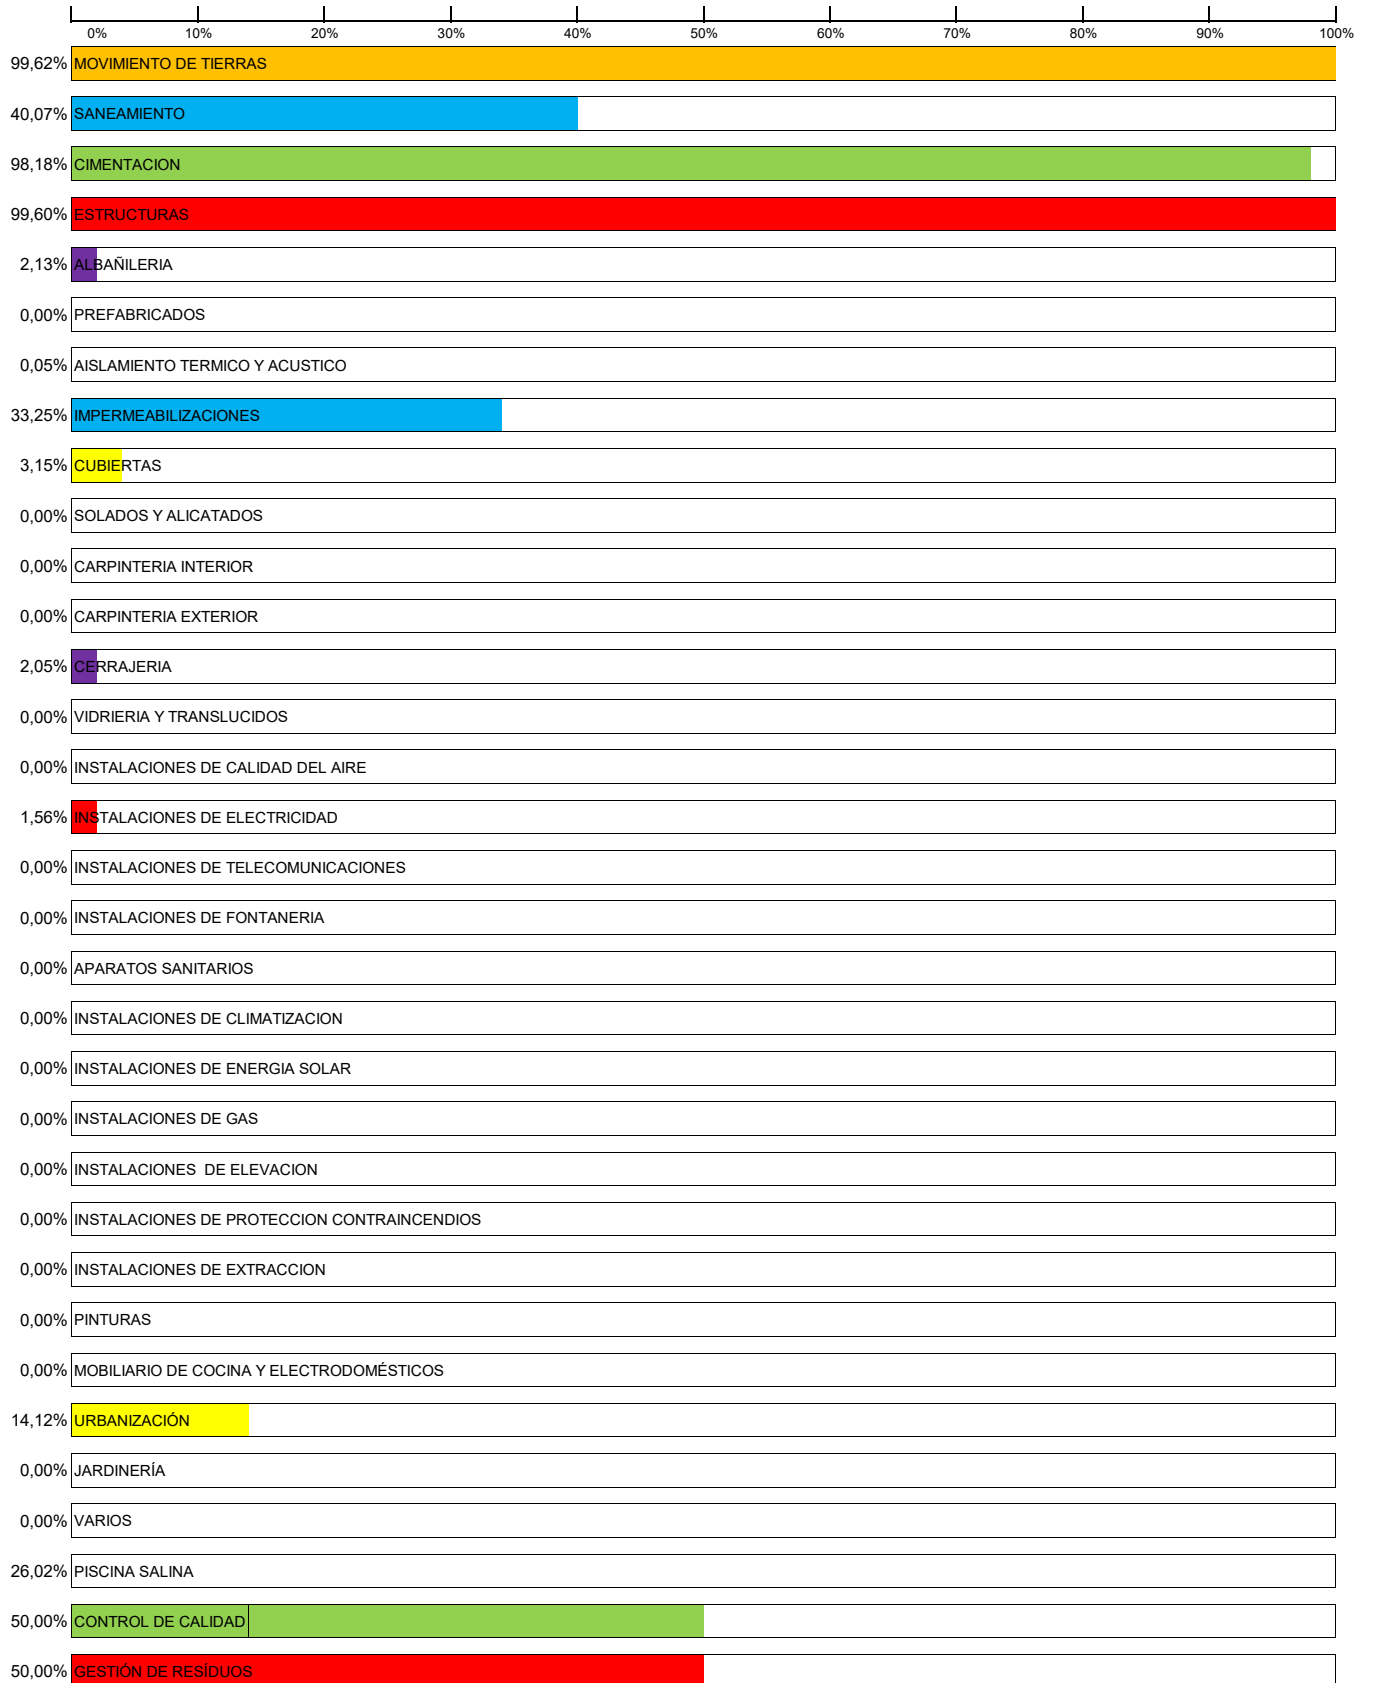

ESTADO DE LA OBRA



ESTADO ACTUAL DE LA OBRA**ANALISIS DE LA MARCHA DE LA OBRA****MARZO 2018**

Tras finalizar la estructura de hormigón armado, ha dado comienzo la ejecución en planta baja de la fachada de ladrillo visto del edificio, con su correspondiente parte proporcional de cargaderos para la apertura de huecos de puertas y ventanas y con la instalación de los andamios necesarios para tal efecto.

Ha dado comienzo también la ejecución de las distintas maestras de formación de pendientes en la cubierta del edificio, como paso previo a su impermeabilización.

4. FOTOGRAFÍAS

